

AVANCES EN INFRAESTRUCTURA 2024

CERRAMIENTO CAE CARLOS LLERAS- MEDELLÍN - ANTIOQUIA

En el marco de ejecución de los contratos interadministrativos entre el ICBF y FINDETER, durante el mes de febrero del 2024 se entregó la intervención para la construcción del Cerramiento provisional del CAE Carlos Lleras con una inversión de **\$973.179.802**, con el fin de garantizar espacios seguros que mejoren los ambientes de aprendizaje y bienestar de los adolescentes, aportando un impacto positivo a la comunidad beneficiada.






HOGAR INFANTIL PALMAR DE VARELA - ATLANTICO

En marzo del 2024 se entregó la intervención para el mejoramiento y la adecuación del Hogar Infantil Palmar de Varela del Instituto con una inversión de **\$959.404.805**, que incluyó cambios de cubierta, de pisos, baterías sanitarias, enchape de muros, estantería de cocina, cambio de redes eléctricas e hidrosanitarias, así como todos los acabados de muros

ANTES



DESPÚES

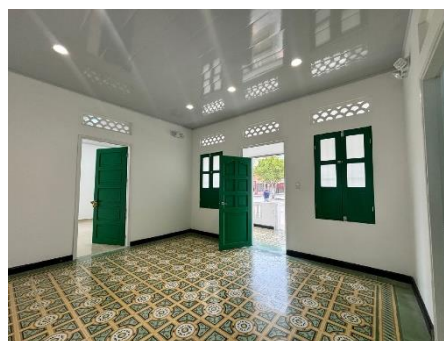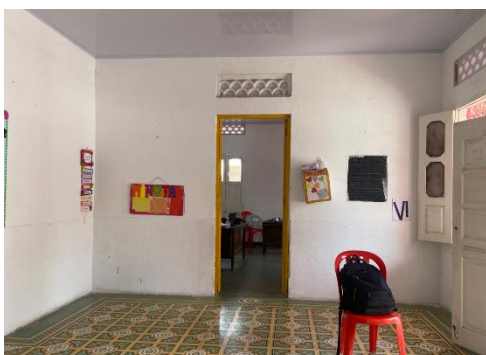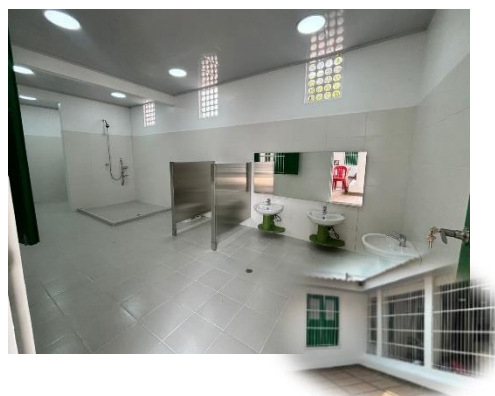

CAE REDENTOR JOVENES- BOGOTÁ



En mayo del 2024 se entregó la intervención para el mejoramiento y la adecuación del CAE Redentor Jóvenes (Femenino) con una inversión de **\$4.379.460.697**, que incluyó cambios de cubierta, de pisos, baterías sanitarias, enchape de muros, estantería de cocina, red contra incendio, cambio de redes eléctricas e hidrosanitarias, así como todos los acabados de muros y cielos rasos.

ANTES	DESPÚES
	
     	 

HOGAR INFANTIL LOS ÁNGELES, SAN JACINTO- BOLÍVAR

En junio del 2024 se entregó la intervención para el reforzamiento estructural, mejoramiento y la adecuación del Hogar Infantil Los Ángeles, San Jacinto- Bolívar del Instituto con una inversión de **\$1.665.030.970**, que incluyó: reforzamiento estructural de la infraestructura, cambios de cubierta, de pisos, baterías sanitarias, enchape de muros, estantería de cocina, cambio de redes eléctricas e hidrosanitarias, así como todos los acabados de muros y cielos rasos.

ANTES	DESPÚES
  	 
	

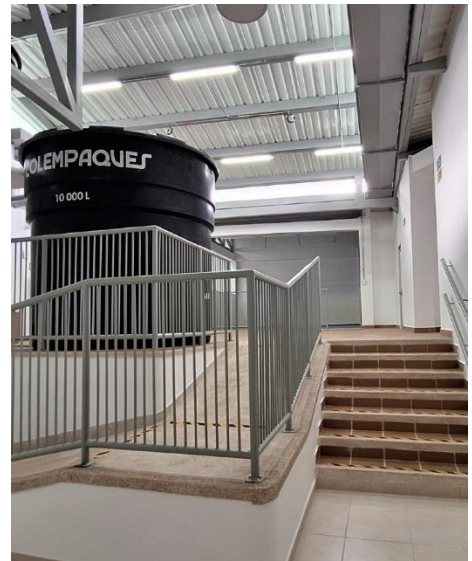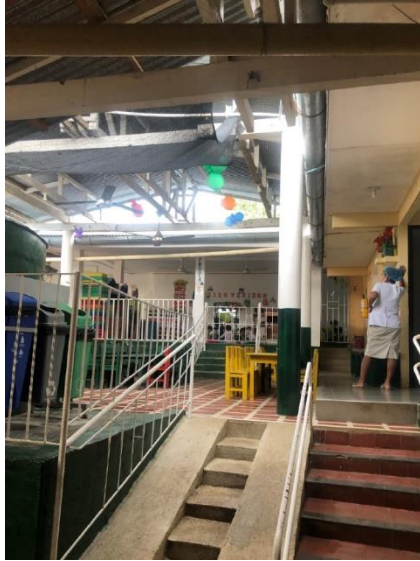

HOGAR INFANTIL EUCALIPTOS, BOGOTÁ

En julio del 2024 se entregó la intervención para el mejoramiento y la adecuación del Hogar Infantil Eucaliptos, Bogotá del Instituto con una inversión de **\$1.530.557.420**, que incluyó cambios de cubierta, de pisos, baterías sanitarias, enchape de muros, estantería de cocina, cambio de redes eléctricas e hidrosanitarias, así como todos los acabados de muros y cielos rasos.

ANTES	DESPÚES
	
	
	

CENTRO ZONAL DEL RÍO, PIVIJAY-MAGDALENA

En mayo del 2024 se entregó la intervención para el mejoramiento y la adecuación del Centro Zonal del río Pivijay-Magdalena del Instituto con una inversión de **\$935.734.818**, que incluyó cambios de cubierta, de pisos, baterías sanitarias, enchape de muros, estantería de cocina, cambio de redes eléctricas e hidrosanitarias, así como todos los acabados de muros y cielos rasos.

ANTES		DESPÚES	
			
			
			

CENTRO ZONAL TIBÚ, NORTE DE SANTANDER

En mayo del 2024 se entregó la intervención para el reforzamiento estructural, mejoramiento y la adecuación del Centro Zonal del río Pivijay- Magdalena del Instituto con una inversión de **\$967.321.433**, que incluyó: reforzamiento estructural de la infraestructura, cambios de cubierta, de pisos, baterías sanitarias, enchape de muros, estantería de cocina, cambio de redes eléctricas e hidrosanitarias, así como todos los acabados de muros y cielos rasos.

ANTES	DESPÚES
	
	

Finalmente, se relaciona a continuación el estado actual de los proyectos restantes que se encuentran en intervención mediante el Contrato Interadministrativo 1412 de 2022, así:

ESTADO CONTRATACIÓN DERIVADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1412 DE 2022						
No.	PROYECTOS- GRUPO 1	CONTRATO	VALOR	CORTE A 17 DE JULIO DE 2024		OBSERVACIONES
	OBJETO OBRA: "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1"			% EJECUCIÓN FÍSICA ETAPA II PROGRAMADO	% EJECUCIÓN FÍSICA ETAPA II EJECUTADO	
1	Sede Regional Guajira, CZ 1 y 2	OBRA/INTERVENTORÍA	\$ 1.856.666.191	93,87%	78,59%	Se encuentra en ejecución de la Etapa II Obra - Plazo finaliza el 24 de julio de 2024.
No.	PROYECTOS- GRUPO 2	CONTRATO	VALOR	CORTE A 23 DE JUNIO DE 2024		OBSERVACIONES
	OBJETO OBRA: "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 2"			% EJECUCIÓN FÍSICA ETAPA II PROGRAMADO	% EJECUCIÓN FÍSICA ETAPA II EJECUTADO	
2	Regional Armenia, Quindio	OBRA/INTERVENTORÍA	\$ 1.097.459.517	75,60%	8,20%	Se encuentra en ejecución de la Etapa II Obra - Plazo finaliza el 12 de agosto de 2024.
3	CZ Libano, Tolima	OBRA/INTERVENTORÍA	\$ 1.359.012.862	48,50%	44,60%	Se encuentra en ejecución de la Etapa II Obra - Plazo finaliza el 18 de agosto de 2024.
4	CZ Buenaventura, Valle del Cauca	OBRA/INTERVENTORÍA	\$ 3.137.199.856	98,00%	7,13%	Se venció el plazo de la etapa II Obra.
No.	PROYECTOS- GRUPO 3	CONTRATO	VALOR	CORTE A 23 DE JUNIO DE 2024		OBSERVACIONES
	OBJETO OBRA: "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS			% EJECUCIÓN FÍSICA ETAPA II PROGRAMADO	% EJECUCIÓN FÍSICA ETAPA II EJECUTADO	

	INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 3”					
5	HI Naranjos, Magangué	OBRA/INTERVENTORÍA	\$ 1.811.401.170	89,00%	86,00%	Se encuentra en ejecución de la Etapa II Obra - Plazo finaliza el 26 de julio de 2024.
6	HI Bambuquito, Ibagué	OBRA/INTERVENTORÍA	\$ 3.068.013.500	0,00%	0,00%	Se encuentra en trámite de Licencia de reforzamiento.
No.	PROYECTOS- GRUPO 4	CONTRATO	VALOR	CORTE A 23 DE JUNIO DE 2024		OBSERVACIONES
	OBJETO OBRA: “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4”			% EJECUCIÓN FÍSICA ETAPA II PROGRAMADO	% EJECUCIÓN FÍSICA ETAPA II EJECUTADO	
8	HI Consota, Pereira	OBRA/INTERVENTORÍA	\$ 2.690.711.405	0,70%	1,40%	Se encuentra en ejecución de la Etapa II Obra - Plazo finaliza el 4 de febrero de 2025.
9	HI El Jardin, Chocó	OBRA/INTERVENTORÍA	\$ 2.955.296.656	9,70%	8,10%	Se encuentra en ejecución de la Etapa II Obra - Plazo finaliza el 14 de enero 2025.
10	HI Alfredo Posada, Pradera-Valle	OBRA/INTERVENTORÍA	\$ 2.282.542.717	0,00%	0,00%	Se encuentra en trámite de Licencia de reforzamiento, la resolución se entregó el 18 de julio de 2024, se firmara acta de inicio el 22 de julio de 2024.
No.	PROYECTOS- GRUPO 5	CONTRATO	VALOR	CORTE A 23 DE JUNIO DE 2024		OBSERVACIONES
	OBJETO OBRA: “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 5 (PTAR)”			% EJECUCIÓN FÍSICA ETAPA II PROGRAMADO	% EJECUCIÓN FÍSICA ETAPA II EJECUTADO	

11	CAE Toribio Maya	OBRA/INTERVENTORÍA	\$ 1.223.454.073	0,00%	0,00%	Se encuentra en trámite de Licencia de construcción y permisos de vertimientos para construcción de PTAR.
12	CAE Los Zagales, Manizales	OBRA/INTERVENTORÍA	\$ 888.780.500	0,00%	0,00%	
13	CAE Santo Angle, Pasto	OBRA/INTERVENTORÍA	\$ 851.106.210	0,00%	0,00%	
No.	PROYECTOS- GRUPO 6	CONTRATO	VALOR	CORTE A 23 DE JUNIO DE 2024		OBSERVACIONES
	OBJETO OBRA: “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 6”			% EJECUCIÓN FÍSICA ETAPA II PROGRAMADO	% EJECUCIÓN FÍSICA ETAPA II EJECUTADO	
14	CAE Nueva Vida, Turbaco	OBRA/INTERVENTORÍA	\$ 3.131.933.761	69,30%	36,10%	Se encuentra en ejecución de la Etapa II Obra - Se solicitará prórroga por 2 mese, plazo actual de finalización 21 de julio de 2024.
15	CAE Buen Pastor, Cali	OBRA/INTERVENTORÍA	\$ 1.611.636.838	0,00%	0,00%	Se encuentra en trámite de Licencia de reforzamiento.
